



صلاحيات مساعد الأمين العام (لطف) مستند صرف  
(مدفوعات أخرى)

قسم الرديات والمصرفات المستردة

210100001	الرقم	معالي وزير الاشغال العامة والاسكان بالإضافة لوظيفته	اسم المستفيد
	الرقم الضريبي		رقم فاتورة
	رقم الحساب		ملاحظات
موافقة عطفة الامين العام على مذكرة تاريخ 2020-12-3 - مطالبة مالية لعضء مركز حدود العمري 2020/16 لشركة حسان الكوز			البيان
16/2020/35776	تاريخ فاتورة المورد	2020/12/08	رقم فاتورة الشيفيد
دفعه مقدمه - سلف مؤقتة	العملة	دينار أردني	نوع الشيفيد
1326	تاريخ إدخال الفاتورة	2020/12/08	رقم الرقم الآلي
غير مدفوع	مرجع المستند		الحالة
0.00	رصيد الإلتزام		رقم أمر الشراء

المستحقات

البيان	الرمز الحسابي	الوصف: توازن/الجغرافي/ الوطني/ البرنامج/ الحساب/ التنظيمي/ الصندوق	المبلغ		
			فلس	دينار	مجموع
موافقة عطفة الامين العام على مذكرة تاريخ 2020-12-3 - مطالبة مالية لعضء مركز حدود العمري 2020/16 لشركة حسان الكوز	100000/150116005/6218035001/0000000000/000000/110100/6212	حساب السلف المصروفة/نققات	0	132566	848
(اجمالي المستحقات بالحروف): فقط مائة واثنين وثلاثون الف وخمسمائة وستة وستون دينار وثمانمائة واربعمون فلس لا غير			0.000	132566	848

الإقتطاعات، المستردات

البيان	الرمز الحسابي	الوصف: توازن/الجغرافي/ الوطني/ البرنامج/ الحساب/ التنظيمي/ الصندوق	المبلغ		
			فلس	دينار	مجموع
(اجمالي الإقتطاعات بالحروف): فقط صفر دينار لا غير			0	0	0
(اجمالي المستحقات صافي المستحقات): فقط مائة واثنين وثلاثون الف وخمسمائة وستة وستون دينار وثمانمائة واربعمون فلس لا غير			0.000	132566	848

أصادق على صحة البيان المذكور اعلاه وأشهد أن الصرف قد تم وفقا للتشريعات المالية:

اسم المفوض بالإنفاق: محمد خليل سليمان الوحيش

اسم المنظم وتوقيعه: محمد خليل سليمان الوحيش

مصدق ومحول أمين صندوق ..... للصرف

دقق فوجد مطابقا للتشريعات المالية

وحددة الرقابة الداخلية: محمد خليل سليمان الوحيش

المدقق الداخلي:

التاريخ: ..... التاريخ: ..... التاريخ: .....

الإسم والتوقيع: ..... الإسم والتوقيع: ..... الإسم والتوقيع: .....

رقم الشيك: ..... رقم الصرف: ..... الرقم الآلي: 1326

إسم وخاتم أمين الصندوق: ..... تاريخ الصرف: .....



وزارة الأشغال العامة والإسكان

وزارة المالية  
الديوان العام  
الوارد 26079  
التاريخ 01/12/2020 الوقت 17:38  
يحول إلى مديرية الحرس العام



٣٥٧٧٠

٢٠٢٠/١٦

الرقم

التاريخ

الموافق

عطوفة امين عام وزارة المالية

الموضوع: العطاء رقم (٢٠٢٠/١٦) الخاص بتنفيذ  
ساحات التبادل التجاري في مركز حدود  
العمري.

اشارة الى كتاب دولة رئيس الوزراء رقم ٩٦٥٠/١/١٣/١٠ تاريخ ٢٠٢٠/٥/١٢ بخصوص تأمين  
المخصصات المالية اللازمة لأعمال تنفيذ ساحات التبادل التجاري في مركز حدود العمري.

أرفق لعطوفتكم اصل المطالبة المالية رقم (٣) على حساب أعمال العطاء موضوع البحث للسادة  
شركة حسان الكوز وأولاده والبالغ قيمتها (١٣٢٥٦٦.٨٤٨) فقط مائة واثنان وثلاثون ألفاً وخمسمائة وستة  
وستون ديناراً و٨٤٨ ساً من قيمة العطاء لمذكور أعلاه.

راجياً عطوفتكم التكرم بالموافقة والإيعاز لمن يلزم بصرفها لصاحب الاستحقاق حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،،

أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان بالوكالة  
المهندس مروان خالد الجمعاني

م. جميل المشاقبة  
مدير ادارة الشؤون المالية والادارية

نسخة: لمدير إدارة الشؤون المالية والإدارية  
نسخة: لمدير الشؤون المالية  
نسخة: للسادة شركة حسان الكوز وأولاده

المرفقات: اصل مسند الصـرف  
اصل المطالبة المالية



الرقم : ٤٧/و/٢٠٢٠/١٦

التاريخ : ٢٠٢٠/١٠/٠٥

عطوفة أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان الأكرم

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : العطاء المركزي رقم (٢٠٢٠/١٦) الخاصبتنفيذ ساحات التبادل التجاري في مركز حدود العمري (ساحة المناولة (Back to Back))الجزء الأولالموضوع : المطالبة المالية رقم (٣) - مطالبة المقاول

ارفق طيه نسخة عن كتاب مقاول المشروع موضوع البحث السادة / شركة حسان الكوز وشريكه للمقاولات رقم عمري /٢٢٦/٢٠٢٠ تاريخ ٢٠٢٠/١٠/٠٣ والمتضمن المطالبة المالية رقم (٣) والخاصة بالمشروع المشار إليه أعلاه وبقيمة (277,954.791) مئتان وسبعة وسبعون ألفاً وتسعمائة وأربعة وخمسون ديناراً وفساً ٧٩١ـ.

واود ان ابين لعطوفتكم بأنه قد تم مراجعة وتدقيق الاعمال الواردة في المطالبة المذكورة أعلاه، وتبين بأنها تنقسم الى قسمين ، حيث ان هناك اعمال تمت خلال فترة عملنا بالمشروع بقيمة (221,472.375) دينار وتم الاشراف من قبلنا عليها، واعمال اضافية تمت بعد انتهاء مهام عملنا بالمشروع بناء على التنسيق المباشر بين صاحب العمل والمقاول وبقيمة (56,482.416) دينار.

للتكرم عطوفتكم بالاطلاع والايغاز للسادة المعنيين باستكمال اجراءات التدقيق وصرف المطالبة بحسب الاصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

المكتب الهندسي الإستشاري العالمي



المهندس / جودت يغمور

وزارة الأشغال العامة والإسكان

الديوان الرئيسي

الوارد : ٤٥٠٩٠ / ٢٠٢٠ / ١٦

التاريخ : ٢٠٢٠ / ١٠ / ٠٦

المحول الى : مدير تنفيذ الطرق

السادة شركة حسان الكوز وشريكه للمقاولات



الرقم : عمري / 226 / 2020

التاريخ : 2020 / 10 / 3

السادة المكتب الهندسي الاستشاري العالمي المحترمين ،،،

المشروع : العطاء المركزي رقم 16 / 2020 الخاص بتنفيذ ساحة التبادل التجاري في مركز حدود العمري  
( ( ساحة المناولة ( Back To Back ) )

الموضوع: المطالبة المالية رقم ( 3 )

تحية طيبة وبعد ،،،

أرفق لكم طيا المطالبة المالية رقم ( 3 ) للأعمال المنجزة في العطاء موضوع البحث حتى تاريخه ، حيث بلغت صافي قيمة المطالبة ( ( 277954.791 دينار ) ) مائتان و سبعة و سبعون ألفاً و تسعمائة و أربعة و خمسون دينار و فلـ 791 سراً لاغير .

راجين الموافقة بالتكرم والإيعاز لمن يلزم لتدقيقها وتصديقها و صرفها لنا حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة حسان الكون و شركة للمقاولات

- نسخة : وزارة الأشغال العامة و الاسكان
- نسخة ملف العطاء



مملكة الأردن

الرقم ١٠ / ١٢ / ١٦٣٠٤  
التاريخ ٢٧ / ذو الحجة / ١٤٤١  
الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٧

معالي وزير الأشغال العامة والإسكان

أشير إلى كتابكم رقم ٢٣٨٤٠/١/١٨/٤ تاريخ ٢٠٢٠/٨/١٥

استعرض مجلس الوزراء كتاب معاليكم المشار إليه أعلاه، ومرفقه (محضر اجتماع اللجنة الفنية - المشكلة بموجب كتابي رقم ١٠/١٣/١٥٩٣٨ تاريخ ٢٠٢٠/٨/١١ - لدراسة الاحتياجات اللازمة لتوصيل الخدمات لكرافانات مخيمات الحجر الصحي للقادمين عبر الحدود البرية في مركز حدود العمري) و(مصفوفة الأعمال اللازم تنفيذها في مركز حدود العمري)، وقور المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٨/١٦ الموافقة على توصيات اللجنة الفنية المشار إليها أعلاه المتضمنة "توفير المخصصات المالية اللازمة، وآلية طرح العطاءات من خلال (استدراج الجروض، أو التلزم، أو الأوامر التوجيهية على العطاءات القائمة)" وذلك على النحو المبين في المصفوفة أعلاه، شريطة أن يتم التنفيذ بإشراف وزارة الأشغال العامة والإسكان ومناجعتها.

واقبلوا فاتق الاحتزام

احد  
لرئيس الوزراء

نسخة إلى معالي وزير الداخلية  
نسخة إلى معالي وزير المياه والري  
نسخة إلى معالي وزير الطاقة والثروة المعدنية  
نسخة إلى معالي وزير المالية  
نسخة إلى معالي وزير الصحة  
نسخة إلى عطوفة رئيس ديوان المحاسبة  
نسخة إلى عطوفة رئيس هيئة الأركان المشتركة  
نسخة إلى عطوفة مدير عمليات خلية الأزمة المركزي الوطني للأمن وإدارة الأزمات  
نسخة إلى عطوفة أمين سر مجلس الوزراء  
قرارة (١٠١٧٩)  
نسخة إلى عطوفة أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية للإغاثة والتنمية والتعاون العربي والإسلامي  
٨/١٧

٢٥٦٧٧ / ١ / ١٨ / ٤

مصفوفة للاعمال المقترح تنفيذها في مركز حدود العمري						
التسلسل	العمل المقترح	الجهة المسؤولة عن التنفيذ	الكملة التقديرية (دينار)	جهة التمويل "ومدى توفر المخصصات"	المدة الزمنية للتنفيذ	الاجراءات المطاوية والتوصيات
احتياجات مياه الحجر الصناعي						
1	انشاء محطة صرف صحي متنقلة لدعم محطة التنقية القائمة	وزارة المياه والري	300,000	سيتم التنفيذ من خلال وزارة المياه والري علما انه تم مخاطبة رئاسة الوزراء للتعقيب مع وزارة المالية لإدارة الموازنة العامة لاعداد المقاولات المالية لتوفير المخصصات وذلك حسب ما جاء في كتاب معالي وزير المياه والري رقم 9/8/2020 تاريخ 7/2/9827	شهر واحد	اتخاذ قرار من رئاسة الوزراء والارد على ما جاء في كتاب معالي وزير المياه والري فيما يتعلق بتوفير المخصصات بطريقة طرح الحطاء حيث تم الطلب من مندوب وزارة المياه والري باتخاذ قرار "التلزم" لهذه الاعمال لتسريع انجازها
2	تنفيذ شبكة المياه لكرافانات الحجر الصحي وربطها بالشبكة الرئيسية.		200,000			
3	رفع كفاءة محطة التحلية والبلر الارتوازي العام					
4	تنفيذ شبكة الصرف الصحي لكرافانات الحجر وربطها بالشبكة الرئيسية.	الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية		تبرع من الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية وذلك حسب ما ورد في كتاب معالي وزير الداخلية رقم 30/5/29716/97343	15 يوم	
5	تنفيذ شبكة الكهرباء لكرافانات الحجر وربطها بالشبكة الرئيسية.	وزارة الطاقة والثروة المعدنية	لكامل اعمال الكهرباء المتخذة في مركز حدود العمري	وزارة الطاقة والثروة المعدنية "مديرية فلسطين"	شهر واحد	تم توفير ما قيمته (77000) دينار و تبقى الحصول على الموافقة مالية من رئاسة الوزراء بقيمة (40000) دينار
6	تركيب محول قدرة KVA 1500 اضافي لتغذية الكرافانات بالكهرباء					
7	تركيب وحدات تكييف للكرافانات الجديدة وبعده اجمالي (397) وحدة بقدرة 1 طن لكل منها	وزارة الاثغال العامة والاسكان	160,000	توفير المخصصات من خلال وزارة الصحة	شهر واحد	تجهيز وثائق الحطاء واستدراج العروض الفنية والمالية وامتثال اجراءات توفير المخصصات المالية
8	تحمل ثلثة التشغيل لتزويد الكرافانات بالمياه والكهرباء لكرافانات الحجر	مديرية الامن العام	....	سيتم ارسال الفواتير ومعزاتها لوزارة المالية لدفعها وذلك بناء على قرار دولة رئيس الوزراء والوارد في محضر اجتماع لجنة تنظيم ومتابعة شؤون الحدود والمطارات بتاريخ 10/8/2020 والعراق ضمن كتاب معالي وزير الداخلية رقم م د 15/2921 تاريخ 10/8/2020 وحسب ما جاء في كتاب معالي وزير الداخلية والموجه الي مطوقه مدير امن العام رقم 1/43/90529 تاريخ 13/8/2020	.....	مخاطبة شركة الكهرباء الاردنية ووزارة المياه والري اذ يجب الحداثات وتسجيلها باسم مديرية الامن العام

مستشار وزير الداخلية  
 مستشار وزير المياه والري  
 مستشار وزير الطاقة والثروة المعدنية

مديرية الامن العام  
 مدير امن العام  
 مدير امن المنطقة

مديرية الامن العام  
 مدير امن المنطقة

مديرية الامن العام  
 مدير امن المنطقة

مديرية الامن العام  
 مدير امن المنطقة

مديرية الامن العام  
 مدير امن المنطقة

9	تحمل كلفة ادامة وصيانة الكرافات الخاصة بالحجر [وتشمل تكليف الصيانة + التشغيل + اجور العمال (الفنيين والصالح) + المواد + قطع الغيار + ..... الخ]	مديرية الاشغال العسكرية	36000/month	مخاطبة الجهات المعنية لتوفير المخصصات اللازمة	اخذ الموافقات اللازمة لتوفير المخصصات وتلزم المادة الشركة العربية لادامة وصيانة جميع كرافات الحجر الصحي في المركز الحدودي
10	تزويد ساحة الحجر (ساحة الكرافات) بنظام كاميرات للمراقبة الامنية	وزارة الاشغال العامة والاسكان	50,000	التنسيق مع رئاسة الوزراء لتوفير المخصصات اللازمة	مخاطبة الرئاسة ل اخذ الموافقة لتوفير المخصصات اللازمة وتلذي الاعمال كما امر تغييرى على اصالح المطايات مساحات المناولة (Back to Back) او طرح عطاء مناصل
11	تنفيذ ساحة ترابية فائرة على امتداد 200 شاحنة لغاية الاصطلاك و بمساحة اجمالية تديرية 10 دولم		50,000		
12	اعادة تاهيل المبياج القائم بوضع سباج حلزوني بارتفاع (1) م او (60) سم حسب ما هو متوفر بالاضافة الى عمل تدعيم وبطول اجمالي (1500) متر		21,750		
المجموع			821,750		شهر واحد
الاتجاهات والمطلوبات الامنية لمركز حدود الحربي					
1	تزويد الاموار الجنوبية والغربية للمركز بفتيك حلزوني بارتفاع (1) م او (60) سم حسب ما هو متوفر وبطول تقريبي 4 كم	وزارة الاشغال العامة والاسكان	58,000	التنسيق مع رئاسة الوزراء لتوفير المخصصات اللازمة	مخاطبة الرئاسة ل اخذ الموافقات اللازمة
2	توفير نظام كاميرات للمساحات والابواب والاموار في المركز الحدودي لغاية المراقبة من قبل مديرية الامن العام		200,000		
3	تزويد المدخل الغربي للمركز الحدودي بكرقان قياس 3*4 متر شاملا وحدة صحية ليتم استخدامها من قبل الجهات الامنية		2,500		
4	تزويد سباج ساحة المناولة (Back to Back) بفتيك حلزوني بارتفاع 1 م وبطول اجمالي 1600 م		23,200		
5	تزويد ساحة المناولة (Back to Back) بـ (6) وحدات صحية اضافية		71,000		
6	كلف ادامة والتشغيل لساحة المناولة (Back to Back)		.....		
المجموع			354,700		شهر واحد
المجموع الكلي			1,176,450	غير شامل كلفة ادامة الشهرية للكرافات	

مدينتي الترتيب  
لدخلك بهذا الضمور

Uccat

كلاي

مقدم

اعمال

اعمال

اعمال

الصفي





وزارة الأشغال العامة والإسكان

الرقم ..... ٢٠٢٠ / ١٦ ..... ١٨٢٥٠  
التاريخ ..... ٢٠٢٠-٠٧-٠١ .....  
الموافق .....

مدير تنفيذ ذ الط رفق  
مدير ضبط ط الج ودة  
مدير السلامة المرورية  
مدير دراسات الط رفق  
مدير الرقابة الداخلية للط رفق  
مدير الإنارة  
مدير الكهروميكانيك  
م. جاد الفيومي - مديرية تنفيذ الطرق  
السادة المكتب الهندسي الإستشاري العالمي "المهندس"

الموضوع: العطاء المركزي رقم (2020/16) الخاص بتنفيذ  
ساحة التبادل التجاري في مركز حدود العمري  
(ساحة المناولة (Back to Back))  
الجزء الأول

إشارة الى كتاب المستشار السادة المكتب الهندسي الاستشاري العالمي رقم 2020/16/و/11 تاريخ  
2020/6/28 ومرفقه كتاب المقاول السادة شركة حسان الكوز وشريكه للمقاولات رقم  
عمري/2020/40 تاريخ 2020/6/27 والمتضمن طلبه باستلام اعمال العطاء موضوع البحث استلاماً  
ابتدائياً.

واستناداً لأحكام المادة (10/1) "تسلم الأشغال" من الشروط العامة والخاصة من دفتر عقد المقولة الموحد  
للمشاريع الانشائية.

قررت تشكيل لجنة فنية منكم وبالإشتراك مع مندوب ديوان المحاسبة لاستلام اعمال العطاء المشار اليها  
اعلاه استلاماً ابتدائياً وموافاتي بمحضر الاستلام موقعاً حسب الاصول .  
وتفضلوا بقبول الاحترام،،،

ر وزير الأشغال العامة والإسكان

مدير ادارة الطرق  
المهندس معن الريضي

نسخة: لعطوفة الامين العام بالوكالفة  
نسخة: لمدير ادارة الط رفق  
نسخة: لمدير تنفيذ ذ الط رفق  
نسخة: لمدير الرقابة الداخلية للط رفق  
نسخة: لرئيس المراقبة على الأشغال والعطاءات الحكومية  
نسخة: للسادة شركة حسان الكوز وشريكه للمقاولات  
المرفقات: صورة عن المكتب المشار اليها اعلاه ومرفقاتها

المشروع: العطاء رقم (2020/16) الخاص بتنفيذ ساحات التبادل التجاري بمركز  
حدود العمري - ساحة المناولة (Back To Back) - الجزء الأول  
الموضوع: الحسميات بسبب الشذوذات في نتائج الفحوصات المخبرية

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى الموضوع أعلاه، نرفق لكم طيه حساب الحسميات بسبب الشذوذات في نتائج الفحوصات المخبرية باتباع ما  
هو معتمد في وزارة الأشغال العامة والإسكان - مديرية المختبرات وضبط الجودة، وكما هو مبين في الجدول أدناه:

الرقم	الحسميات الشذوذات في نتائج الفحوصات المخبرية	الحسميات (دينار)
1.	مواد الطبقة الرابطة	1452
2.	مواد الطبقة السطحية	6012
3.	العينات اللبية (الطبقة السطحية والطبقة الرابطة)	22956
	المجموع	30421

أما بخصوص الشذوذ في نتائج العينات اللبية للخلطة الإسفلتية السطحية والتي تقع خارج أسس الحسم والتي تبلغ  
المساحة الممثلة لها (6000) م<sup>2</sup>، وحيث ان شروط العقد المادة (4/9) تخول المهندس، بالاتفاق مع صاحب العمل، في حال  
أخفقت الأشغال أو أي قسم منها في اجتياز "الاختبارات عند الإنجاز" تخفيض قيمة العقد بمبلغ يكون مناسباً لتغطية القيمة  
المتحققة عن خفض قيمة الانتفاع بالنسبة لصاحب العمل نتيجة لهذا لإخفاق، وعليه نطلب منكم التنسيب لصاحب العمل  
باعتبار قيمة 50% من قيمة البند = 6000م<sup>2</sup> × 5.70 دينار/م<sup>2</sup> × 50% = (17100) دينار، وعليه تصبح القيمة  
الإجمالية للحسميات (47521) دينار.

وعليه، نرجو منكم التكرم بتدقيق الحسابات المرفقة والتنسيب لصاحب العمل باعتمادها حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،  
شركة حسان الكوز وشريكه

شركة حسان الكوز وشريكه  
Hassan Al-Kouz and Partner

نسخة:  
• وزارة الأشغال العامة والإسكان.  
• الملف

العطاء المركزي رقم (16/2020) الخاص بتنفيذ ساحات التبادل التجاري في مركز حدود العمري ((ساحة المناولة (Back to Back)) الجزء الأول

المالك :- وزارة الأشغال العامة و الإسكان		المطالبة المالية رقم (3) للأعمال المنجزة بالعطاء		المستشار :- المكتب الهندسي الاستشاري العالمي ACE	
المقاول :- شركة حسان الكوز و شريكه للمقاولات					
رقم بند	وصف العمل (أو الترخيم العمومي جدول الكيفيات)	المبلغ (دينار)	المبلغ (دينار)	المبلغ (دينار)	المبلغ (دينار)
1	Bill No.(1) General Provisions and Preliminaries	298,500.00	0.00	278,303.78	278,303.78
2	Bill No.(2) Earth Works	223,970.00	0.00	231,251.61	231,251.61
3	Bill No.(3) Sub Base and Base course	238,000.00	0.00	225,296.62	225,296.62
4	Bill No.(4) Bituminous Construction	469,250.00	0.00	219,783.02	219,783.02
6	Bill No.(6) Lighting, Traffick Signals and Electrical Installations	260,000.00	0.00	149,874.78	149,874.78
8	Bill No.(8) Incidental Construction	89,800.00	0.00	88,166.19	88,166.19
	Grand Total of Bills	1,579,520.00		1,376,983.49	1,376,983.49
	Provisional Sums and prime costs & Percentage	547,000.00		418,855.26	418,855.26
	Sub total excluding P.S and Prime Costs (10-11)	1,032,520.00		958,128.23	958,128.23
	Percent Addition or Deduction %	-1%		-1%	-1%
	Value of Addition or deduction 12x13	-10,325.20		-9,581.28	-9,581.28
	Total (1) : 12 ± 14	1,022,194.80		948,546.95	948,546.95
	Total of Contract : 11+15	1,569,194.80		1,367,402.21	1,367,402.21
1	الخسرات 10 % حد اعلى 5%	78459.740	1	1367402.207	1367402.207
2	قيمة الفعات السابقة	1338654.335	2	375187.659	375187.659
3	قيمة الحسميات (شذوذات فحص غيرى)	47521.000		3690.31,893	3690.31,893
	مجموع التبريلات	1464636.075		1742689.666	1742689.666
	صافي قيمة المطالبة			277954.791	277954.791

تصديق الوزارة  
م. جاد الفيومي

مهندس الاتصال  
م. جاد الفيومي

المهندس  
م. جودت يغموي  
المكتب الهندسي الاستشاري العالمي  
Associated Consulting Engineers  
Int'l.

مقيم المقاول  
شركة حسان الكوز وشريكه للمقاولات



صلاحيات مساعد أمين  
للمصرف (مدفوعات أخرى)

قسم الرديات والمصرفات المستردة

اسم المستفيد	معالي وزير الاشغال العامة والسكان بالاضافة لوظيفته	الرقم	210100001
المورد		الرقم الضريبي	
ملاحظات		رقم الحساب	
البيان	موافقة عطوفة الامين على مذكرة تاريخ 17-12-2020 مشروع حدود العمري - صندوق كورونا - مطالبة شركة المشاريع المتحدة		
رقم فاتورة المستفيد	17/2020/36832	ت. فاتورة المورد	2020/12/31
النوع	دفعة مقدمة - سلف مؤقتة	العملة	دينار اردني
الرقم الآلي	1600	ت. إدخال الفاتورة	2020/12/31
الحالة	غير مدفوع	مراجع المستند	
رقم أمر الشراء		رصيد الإلتزام	0.00

المستحقات

البيان	الرمز الحسابي	المبلغ		
		أجنبي	محلي	
	الوصف: توازن/الجغرافي/الوطني/البرنامج/الحساب/التنظيمي/الصندوق		دينار	فلس
موافقة عطوفة الامين على مذكرة تاريخ 17-12-2020 مشروع حدود العمري - صندوق كورونا - مطالبة شركة المشاريع المتحدة	100000/150116005/6218035001/0000000000/00000/110100/6212	0	179953	900
	حساب السلف المصروفة/نفقات			
(إجمالي المستحقات بالحروف): فقط مائة وتسعة وسبعون ألف وتسعمائة وثلاثة وخمسون دينار وتسعمائة فلس لا غير		0.000	179953	900

الإقتطاعات، المستردات

البيان	الرمز الحسابي	المبلغ		
		أجنبي	محلي	
	الوصف: توازن/الجغرافي/الوطني/البرنامج/الحساب/التنظيمي/الصندوق		دينار	فلس
(إجمالي الإقتطاعات بالحروف): فقط صفر دينار لا غير		0.000	0	000
صافي المستحقات		0.000	179953	900

أصادق على صحة البيان المذكور أعلاه وأشهد أن الصرف قد تم وفقاً للتشريعات المالية:

اسم المفوض بالإتفاق:

توقيعه:

محمد الوحيش

اسم المنظم وتوقيعه:

دقق فوجد مطابقاً للتشريعات المالية

المدقق الداخلي: هسوم الرقابة المالية

التاريخ: 31 DEC 2020

الاسم والتوقيع: هسوم الرقابة المالية

رقم الشيك: 1600

الرقم الآلي: 1600

اسم المدقق: هسوم الرقابة المالية

التوقيع: هسوم الرقابة المالية

اسم وخادم أمين الصندوق:

قسم الرديات والمصرفات المستردة

تاريخ: 17/12/2020



وزارة الأشغال العامة والإسكان

٣٦٨٣٢

٢٠٢٠/١٧

الرقم ٢٠٢٠-١٢-٠٩

التاريخ

الموافق

عطوفة امين عام وزارة المالية

وزارة المالية
الديوان العام
الوارد 26941
التاريخ 2020/12/10 الوقت 12:59
يحول إلى مديرية



الموضوع: العطاء رقم (2020/17) الخاص بتنفيذ  
ساحات التبادل التجاري في مركز حدود العمري ساحة  
المناولة Back to back الجزء الثاني .

اشارة الى كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 9650/1/13/10 تاريخ 2020/5/12 بخصوص تأمين  
المخصصات المالية اللازمة لأعمال تنفيذ ساحات التبادل التجاري في مركز حدود العمري.

أرفق لعطوفتكم اصل المطالبة المالية رقم (2) على حساب أعمال العطاء موضوع البحث للسادة  
شركة المشاريع المتحدة والبالغ قيمتها (179953.900) فقط مائة وتسعة وسبعون ألفاً وتسعمائة وثلاثة  
وخمسون ديناراً و900 ساً من قيمة العطاء لمذكور أعلاه.

راجياً عطوفتكم التكرم بالموافقة والإيعاز لمن يلزم بصرفها لصاحب الاستحقاق حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،

أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان بالوكالة  
المهندس مروان خالد الجمعاني

مدير ادارة الشؤون المالية والادارية  
م. جميل المشاقبة

السيد: السيد  
٢٠٢٠/١٢


نسخة: لمدير إدارة الشؤون المالية والإدارية

نسخة: لمدير الشؤون المالية

نسخة: للسادة شركة المشاريع المتحدة

المرفقات: اصل مسند التصرف

اصل المطالبة المالية





البنك المركزي التونسي

مستند صرف النفقات

الدائرة: (رقماً وكتابة)  
الفصل:  
البرنامج:  
المشروع:  
رقماً وكتابة)  
المادة:

المركز:  
رقم التأدية:  
التاريخ:

(الاسم من ثلاثة مقاطع والعنوان بالكامل)  
مطلوب الى: مستلة المشاريع المتحدة

البيان	المبلغ بالعملة الأجنبية		السعر او البديل	المبلغ	
	الكمية	سعر الصرف		دينار	فلس
وذلك ضمن المطالبة الثانية على حساب المطاوع رقم ١٧/٢٠٠٤ والمصاريف المتبادلة التجاري في مركز خدمة العمري ساحة المنارة Back to Back مربحاً				١٧٩٩٥٣٩	
				١٧٩٩٥٣٩	
				المجموع فقط	

توقيع مدير العمليات  
مستلة المشاريع المتحدة

أصادق على صحة البيان المذكور أعلاه وأشهد أن الاتفاق قد تم وفقاً لأحكام قانون الموازنة العامة  
اسم المفوض بالاتفاق: البنك المركزي  
اسم المنظم وتوقيعه: [Signature]  
توقيعه:

دقق فوجد مطابقاً للتشريعات المالية. مصدق ومحول لأمن صندوق مصرف

سجل تحت رقم: ٢٠٠٤/١١/٤٦  
التاريخ: ٢٠٠٤/١١/٤٦  
اسم والتوقيع: عالم الرجيب  
اسم والتوقيع: [Signature]  
التاريخ: ٢٠٠٤/١١/٤٦  
اسم والتوقيع: [Signature]

وصلني مبلغ ١٧٩٩٥٣٩ ديناراً  
رقم الشيك: [Blank]  
تاريخه: [Blank]

وزارة المالية  
مستلة المشاريع المتحدة والتمهينش  
دقق ويجاز للصرف  
اسم والتوقيع: [Signature]  
اسم وخاتم أمين التوثيق: [Signature]  
التاريخ: [Blank]

نوع الإقطاع	الإقطاعات	
	دينار	فلس
طوايع سبلغ	٢٧٠	
مطالعة + خزائن	١	
طوايع حادلات الامر العمري	١٣٥٠	
المجموع		

## اقرار استلام دفعة على الحساب

اقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي أدناه ( ..... ) نفر نحن الموقعين

إمضائنا وخاتمتنا في أدناه ( شركة المشاريع اكدية ) ياتنا قد

قيضنا من وزارة الاشغال العامة والإسكان مبلغ وقدره ( ١٥٧٩٩٨٧٩ ) دينار اردني لا غير

فقط ( عبد الله عبد الرحمن )

وذلك قيمة الدفعة ( الدفعة الأولى رقم (٢) )

عن مشروع : ( الشارع الجديد لشارع الملك عبد الله في منطقة شرق عمان )

عطاء رقم : ( ١٠١/١٠١/٢٠٢٠ )

وعليه توقع تحريرا ٢٠٢٠ / ١١ / ٣٠

اسم المقاول : شركة المشاريع اكدية

اسم المفوض بالتوقيع : عبد الرحمن عبد الله

توقيع المفوض بالتوقيع : (توقيع)



الخاتم :


تم التوقيع بحضور :

الاسم :

الوظيفة :

التوقيع :

التاريخ :



أص  
إسم  
التاريخ  
الإسم  
الرقم الأ  
تاريخ ال

الما



وزارة الأشغال العامة والإسكان

١٨٢٤٥

٢٠٢٠ / ١٧

الرقم

٢٠٢٠-٠٧-٠١

التاريخ

الموافق

مدير تنفيذ ذ الط ر ق  
مدير ضبط الج و دة  
مدير الس لامة المروري ة  
مدير دراسات الط ر ق  
مدير الرقابة الداخلي ة للط ر ق  
مدير الإنارة  
مدير الكهروميك اتيك  
م. جاد الفيومي - مديرية تنفيذ الطرق  
السادة المكتب الهندسي الإستشاري العالمي "المهندس"

الموضوع: العطاء المركزي رقم (2020/17) الخاص بتنفيذ  
ساحة التبادل التجاري في مركز حدود العمري  
(ساحة المناولة (Back to Back)  
الجزء الثاني

إشارة الى كتاب المستشار السادة المكتب الهندسي الاستشاري العالمي رقم 2020/17/و/8 تاريخ  
2020/6/28 ومرفقه كتاب المقاول السادة شركة المشاريع المتحدة رقم 20/3467/م ر تاريخ  
2020/6/25 والمتضمن طلبه باستلام اعمال العطاء موضوع البحث استلاماً ابتدائياً.  
وامتداداً لأحكام المادة (10/1) "تسلم الأشغال" من الشروط العامة والخاصة من دفتر عقد المقولة المود  
للمشاريع الانشائية .

قررت تشكيل لجنة فنية منكم وبالإشتراك مع مندوب ديوان المحاسبة لاستلام اعمال العطاء المشار اليه  
اعلاه استلاماً ابتدائياً وموافاتي بمحضر الاستلام موقعاً حسب الاصول .  
وتفضلوا بقبول الاحترام،،،

وزير الأشغال العامة والإسكان

مدير إدارة الطرق  
المهندس معن الرضي

نسخة: لعطوفة الامين العام بالوكالة  
نسخة: لمدير إدارة الطرق  
نسخة: لمدير تنفيذ ذ الط ر ق  
نسخة: لمدير الرقابة الداخلي ة للط ر ق  
نسخة: رئيس المراقبة على الأشغال والعطاءات الحكومية  
نسخة: للسادة شركة المشاريع المتحدة  
المرفقات: صورة عن المكتب المشار اليها اعلاه ومرفقاتها





الرقم : ٢١/و/٢٠٢٠/١٧

التاريخ : ٢٠٢٠/٠٩/٢٨

عطوفة أمين عام وزارة الاشغال العامة والإسكان الأكرم

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : العطاء المركزي رقم (٢٠٢٠/١٧) الخاص

بتنفيذ ساحات التبادل التجاري في مركز حدود العمري (ساحة المناولة (Back to Back))

الجزء الثاني

الموضوع : المطالبة المالية رقم (٢) - مطالبة المقاول

ارفق طيه نسخة عن كتاب مقاول العطاء موضوع البحث السادة / شركة المشاريع المتحدة - مقاولات عامة رقم ٣٥٤٤/٢٠/م ر تاريخ ٢٧/٠٩/٢٠٢٠ المتضمن المطالبة المالية رقم (٢) الخاصة بتنفيذ ساحات التبادل التجاري بمركز حدود العمري والبالغ قيمتها (٤١٥٣٨٦,٢٧٠) اربعمائة وخمسة عشر الفاً وثلاثمائة وستة وثمانون ديناراً وفسلساً ٢٧٠-أ.

وحيث ان هذه المطالبة تشتمل على اعمال تمت بعد انتهاء مهامنا وتواجدنا في المشروع منذ تاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٣٠ (تاريخ انتهاء تواجد الجهاز المقيم بالموقع) ، ٠٦/٠٧/٢٠٢٠ (تاريخ أنتهاء دعم المكتب الرئيسي)، فإننا ننسب لعطوفتكم التكرم بالايجاز للسادة المعنيين بمتابعة الاعمال التي تم تكليف المقاول بها ومتابعتها من قبل اجهزة الوزارة لمراجعة المطالبة ليتم صرفها للمقاول وبحسب الاصول.

مع التكرم بملاحظة ما ورد بكتابنا رقم ١٧/٢٠٢٠/و/٢٠٢٠ تاريخ ١٧/٠٩/٢٠٢٠ بخصوص الحسميات على الشذوذات في فحوصات طبقات الاسفلت وخلافها وفيما اذا تم اعتمادها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

المكتب الهندسي الاستشاري العالمي

المهندس / جودت يغمور

- نسخة / السادة شركة المشاريع المتحدة - مقاولات عامة



شركة المشاريع المتحدة - مقاولات عامة  
United Enterprises Company - General Contracting

Ref. :  
Date :

الرقم : ٢٠/٣٥٤٤ م  
التاريخ : ٢٠٢٠/٠٩/٢٧

السادة / المكتب الهندسي الاستشاري العالمي المحترمين

المشروع: العطاء رقم (٢٠٢٠/١٧) الخاص بتنفيذ ساحات التبادل التجاري بمركز حدود العمري - ساحة المناولة (Back To Back) - الجزء الثاني  
الموضوع: المطالبة المالية رقم (٢)

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نرفق لكم طيه المطالبة المالية رقم (٢) والخاصة بتنفيذ ساحات التبادل التجاري بمركز حدود العمري، والبالغ قيمتها (٤١٥٣٨٦,٢٧٠) دينار فقط أربعمئة وخمسة عشر الفا وثلاثمئة وستة وثمانون ديناراً ومائتان وسبعون فلساً لا غير.

راجين التكرم بتدقيق المطالبة طيه والتنسيب لصاحب العمل بصرفها حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة المشاريع المتحدة

المدير التنفيذي

م. جلال القدس



نسخة:  
• وزارة الأشغال العامة والإسكان.  
• الملف

أصادق على

إسم المنظم وتوة

التاريخ :

الإسم والتوقيع :

الرقم الالي: 1600

تاريخ الصرف :

١٧ شارع عوده ابو تايه - الشميساني - ص.ب: ٨٣٠٢٨٧ - الرمز البريدي: ١١١٨٣ عمان - الأردن - تلفون: ٥٦٦٩٦٢٨، ٥٦٦٢٦٢٨ - فاكس: ٥٦٦٩٦٢٨  
17 Tayeh St. - Shmessani - P.O.Box: 830287 - Postal Code: 11183 Amman - Jordan - Tel.: 5662628, 5669628 - Fax: 5687436  
E-mail: info@uec-jo.com , Web Site: http://www.uec-jo.com

**BACK TO BACK YARD AT OMARY BORDER**  
**(Section -2) Tender No. 17/2020**  
**INTERIM PAYMENT CERTIFICATE NO. ( 2 )**



FOR THE PERIOD ENDING **22/09/2020** Page 1 of 12

Employer :	Ministry of Public Works and Housing
Engineer :	Associated Consulting Engineering ( ACE )
Contractor :	United Enterprises Co. ( UEC )
Contract Value :	JOD 1,604,960.250
Contract Start Date :	May 20, 2020
Contract Completion Date :	

**Summary of :**

Description	Value JD	Notes
Work Executed to date	1,430,073.65	1696525.3 CP
Variation Orders	228,091.10	1366526.74 CP
Add Materials on Site	225,073.1	CP
Additional Works		
<b>Gross Amount Due to Date ( a+b+c+d )</b>	<b>1,658,164.750</b>	

**Deductions :**

Description	Value JD	Notes
5% Retention	80,248.01	
Previous Payment	1,061,396.49	
Others	133,397.93	CP
10% Advance Payment Recovery		
Penalties of the Test Results	101,133.98	0 CP
<b>Total Deductions ( a+b+c+d+e )</b>	<b>1,242,778.48</b>	1411645.94 CP

**Amount To Be Paid in This Interim Certificate** **415,386.27** JD

**Amount in Words :** Four Hundred Fifteen Thousand Three Hundred Eighty Six Dollars and Twenty Seven Cents

<b>CONTRACTOR :</b> ENTERPRISES COMPANY	<b>Consultant</b> <b>(The Engineer)</b> Associated Consulting Engineers  (Engineer's Representative) المهندسين الاستشاريين العالميين Associated Consulting Engineers Int'l.	<b>MPWH</b>   التاسع
--	---	-------------------------------

فلا  
00  
00  
أصادق  
إسم المد  
التاريخ :  
الإسم والتوقيع  
الرقم الآلي  
تاريخ الصرف



مستند صرف  
(مدفوعات أخرى)

صلاحيات ماعدا لامين  
للشؤون المالية لطفا

قسم الرديات والمصروفات المستردة			
210100001	الرقم	معالي وزير الاشغال العامة والامكان بالاضافة لوظيفته	اسم المستفيد
	الرقم الضريبي		المورد
	رقم الحساب		ملاحظات
موافقة عطوفة الامين على مذكرة تاريخ 2020-12-30 - عطاء حدود العمري - صندوق كورونا			
الشيك	طريقة الدفع	2020/12/31	رقم فاتورة المستفيد
1	سحب الصرف	دينار أردني	37641/2020/16
2020/12/31	تاريخ الاستاذ العام	2020/12/31	رقم النوع
			دعما مقدمة - سلف مؤقتة
			الرقم الآلي
			1599
			الحالة
			غير مدفوع
		0.00	رقم أمر الشراء

المستحقات			
البيانات	الوصف	الرقم الآلي	المبلغ
موافقة عطوفة الامين على مذكرة تاريخ 30-12-2020 - عطاء حدود العمري - صندوق كورونا	حساب السلف المصروفة/نفقات	100000/150116005/6218035001/000000000/00000/110100/6212	728
			186632
			0.000
[إجمالي المستحقات بالحروف]: فقط مائة وستة وثمانون ألف وستمانمائة واثنين وثلاثون ديناراً وسبعماناً وثمانية وعشرون فلس لا غير			

الإقتطاعات، المستردات			
البيانات	الوصف	الرقم الآلي	المبلغ
			000
			186632
			728
[إجمالي الإقتطاعات بالحروف]: فقط صفر دينار لا غير			
[إجمالي المستحقات بالحروف]: فقط مائة وستة وثمانون ألف وستمانمائة واثنين وثلاثون ديناراً وسبعماناً وثمانية وعشرون فلس لا غير			

أصادق على صحة البيان المذكور أعلاه وأشهد أن الصرف قد تم وفقاً للتشريعات المالية:

إسم المعروض بالإتفاق: سليم

إسم المعظم وتوقيعه: محمد خليل سليمان

تاريخ: 31 DEC 2020

الرقم الآلي: 1599

تاريخ الصرف: 31/12/2020

الرقم المصرفي: 1599

اسم المدقق: محمد خليل سليمان

اسم المصدق: محمد خليل سليمان

اسم المستفيد: معالي وزير الاشغال العامة والامكان بالاضافة لوظيفته

رقم الحساب: 100000/150116005/6218035001/000000000/00000/110100/6212

الوصف: حساب السلف المصروفة/نفقات

الرقم الضريبي: 210100001

طريقة الدفع: سحب الصرف

تاريخ الدفع: 2020/12/31

رقم الشيك: 1

اسم المستفيد: معالي وزير الاشغال العامة والامكان بالاضافة لوظيفته

رقم فاتورة المستفيد: 37641/2020/16

رقم النوع: دعما مقدمة - سلف مؤقتة

الحالة: غير مدفوع

رقم أمر الشراء: 1599



وزارة الأشغال العامة والإسكان



٣٧٦٤١

٢٠٢٠/١٦

الرقم  
التاريخ  
الموافق

٢٠٢٠-١٢-١٤

عطوفة امين عام وزارة المالية

وزارة  
الديوان العام  
الوارد 27275  
التاريخ 2020/12/14 الوقت 57  
يحول إلى مديرية الخزينة العامة

الموضوع: العطاء رقم (٢٠٢٠/١٦) الخاص بتنفيذ  
ساحات التبادل التجاري في مركز حدود  
العمرى.


إشارة إلى كتاب دولة رئيس الوزراء رقم ٩٦٥٠/١/١٣/١٠ تاريخ ٢٠٢٠/٥/١٢ بخصوص تأمين  
المخصصات المالية اللازمة لأعمال تنفيذ ساحات التبادل التجاري في مركز حدود العمرى.

أرفق لعطوفتكم اصل المطالبة المالية رقم (٤) على حساب أعمال العطاء موضوع البحث للسادة  
شركة حسان الكوز وأولاده والبالغ قيمتها (١٨٦٦٢٢.٧٢٨) فقط مائة وستة وثمانون ألفاً وستمئة واثنان  
وثلاثون ديناراً و٧٢٧ ساً من قيمة العطاء المذكور أعلاه.

راجياً عطوفتكم التكرم بالموافقة والإيعاز لمن يلزم بصرفها لصاحب الاستحقاق حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول الاحترام،،،،

أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان بالوكالة  
المهندس مروان خالد الجمعاني  
مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية  
م. جميل المشاقبة

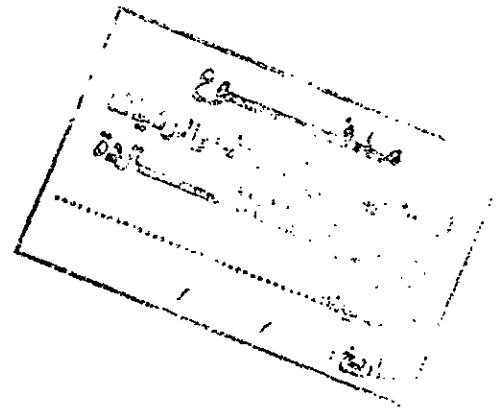

نسخة: مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية  
نسخة: مدير الشؤون المالية  
نسخة: للسادة شركة حسان الكوز وأولاده  
المرفقات: اصل مستند الصرف  
اصل المطالبة المالية

دزي رقم ( 16/2020 ) الخاص بتنفيذ ساحات التبادل التجاري في مركز حدود العمري ((ساحة المناولة (Back to Back)) الجزء الأول

ملاحظات		قيمة الاعمال المنجزة		قيمة الاعمال	وصف العمل (أو الترجمة العربية لجدول الكميات)
		حتى تاريخه	المنفذة سابقا	حسب جدول الكميات	
		دينار	دينار	دينار	
		275025,76	278,503.78	298,500.00	Bill No.(1) General Provisions and Preliminaries
		231,251.61	231,858.67	223,970.00	Bill No.(2) Earth Works
			225,296.62	238,000.00	Bill No.(3) Sub Base and Base course
		376232,168	402,406.76	469,250.00	Bill No.(4) Bituminous Construction
		148874,78	151,251.48	260,000.00	Bill No.(6) Lighting, Traffick Signals and Electrical Installations
			88,166.19	89,800.00	Bill No.(8) Incidental Construction
		1344847,148	1,376,983.49	1,579,520.00	Grand Total of Bills
		413200,56	418,855.26	547,000.00	Provisional Sums and prime costs & Percentage
		931646,588	958,128.23	1,032,520.00	Sub total excluding P.S and Prime Costs (10-11)
			-1%	-1%	Percent Addition or Deduction %
		-9316,466	-9,581.28	-10,325.20	Value of Addition or deduction 12x13
		922330,122	948,546.95	1,022,194.80	Total (1) : 12 ± 14
		1325536,682	1,367,402.21	1,569,194.80	Total of Contract : 11+15
الرقم	الحسيمات والوفيات	الرقم	الاستحقاقات	الرقم	القيمة
1	الخصومات 10 % حد اعلى 5%	1	قيمة الاعمال المنجزة	78459.740	1335530,682
2	قيمة الدفعات السابقة	2	الاعمال الاضافية (منقول من صفحة AD)	1471221.183	459886.600
					186632,728
					400782,969
					277607.885
					1827288.808
					736313,65
					1549680.923
					صافي قيمة المطالبة
					مجموع التهربات
					مجموع الكلي للاستحقاقات

مستشاري العالمي ACE

الكوز و شريكه للمقاولات

وصف العمل  
(أو الترجمة العربية لجدول الكميات)

المهندس

جودت ياقوت

م. جودت ياقوت

م. جودت ياقوت

م. جودت ياقوت

م. جودت ياقوت

م. جودت ياقوت

م. جودت ياقوت

م. جودت ياقوت

م. جودت ياقوت

م. جودت ياقوت

م. جودت ياقوت

تنظيم المقاول

شركة حسان الكوز و شريكه للمقاولات

Associated Consulting Engineers  
Int'l.

شركة حسان الكوز وشريكه  
Hassan Al-Kouz and Partner

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وزارة الأشغال العامة والإسكان

لائحة الوقائع



رقم ملف الوزارة: ٢٠٢/١٦

رقم الكتاب الوارد: ٥٦/١٦/٢٠٢

رقم تسجيل الوارد: ٥٦٤٤

تاريخه: ٢٠٢/١٦/٢٠٢

مصدر الكتاب: المكتب الهندسي الاستشاري الموضوع: مطالعة ٤/ شركة حسان المرم

الرقم	التاريخ	المراسل	المشروعات والتوقييع
	٢٠٢/١٢/١٣	مدينة تنفيذ الفرق	استباجات المطالبة عن السيد الدكتور الشيخ بإختصاص فيه (١٥) من الأعمال الكبري الموافق على اسماها ايضا (١٥)
	٢٠٢/٢/١٤	مدينة تنفيذ الفرق	٢٧٧٦٥٦١٨٨٥ تم تصدق لطلبه لطلب رقم (١٥) وبعد لتعديل طلب شروحات شركة تتميزه تمت اتمت لطلبه لطلبه للفرق ١٨٦٦٣٢١٧٢٨ (١٥) من الأعمال الكبري
	١٢/١٣	مدينة تنفيذ الفرق	ارصد الايعاز لمت يلزم لطلبهم لاستكمال اشغال اتمت لطلبه صحة الاصل تمت اتمت لطلبه المطالبة بعد التعديل (١٨٦٦٣٢١٧٢٨) وبناء وضع الشرح اعلاه
	١٢/١٤	الرئيس	٢٠٢/١٤/١٤
	١٢/١٥	مدير مكتب المطالعة	



رقم الصرف: ..... شهر  
 المركز: .....  
 رقم التأدية: ..... التاريخ

البنك المركزي الفلسطيني

مستند صرف النفقات

الفصل: .....  
 البرنامج: .....  
 المشروع: .....  
 المادة: .....  
 (رقم وكمية)

(الاسم من ثلاثة مقاطع والعنوان بالكامل)

مطلوب الى: صندوق الجوازات

البيان	المبلغ بالعملية الأجنبية		السعر او البديل		المبلغ	
	العدد الكمية	سعر الصرف	دينار	فلس	دينار	فلس
رد ذلك قيمة المبالغ (ع) كل ص.م. العطاء رقم ١٦/٢٠٠٢ مما يخص تنفيذ سندات الجوازات التجارية والتي هي مركز عدد ١٤٠١٩					١٨٦٦٢	٧٢٨
					١٨٦٦٢	٧٢٨

وحدة الرقابة والتدقيق المالي والإداري  
 رقم ١٤٠١٩  
 التوقيع: .....  
 الاسم: .....  
 التاريخ: ٢٠٠٢ / ١٦ / ٢٠٠٢

أصادق على صحة البيان المذكور أعلاه وأشهد أن الاتفاق قد تم وفقاً لأحكام قانون الموازنة العامة  
 اسم المفوض بالاتفاق: أحمد أبو حمزة

اسم المنظم وتوقيعه: عالية

دقق فوجد مطابقاً للتشريعات المالية: مصدق ومحول أمين صندوق: الصرف

سجل تحت رقم: .....

التاريخ: ٢٠٠٢ / ١٦ / ٢٠٠٢ التاريخ: ٢٠٠٢ / ١٦ / ٢٠٠٢

الاسم والتوقيع: أحمد أبو حمزة الاسم والتوقيع: عالية

وصلني مبلغ: ..... ديناراً ..... فلساً في ٢٠ / ١ / ٢٠٠٢


رقم الشيك: .....

تاريخه: .....

وزارة المالية  
 مديرية المراقبة والتفتيش  
 وحدة الرقابة المالية  
 دقق ووجد مطابقاً للتشريعات المالية  
 الاسم والتوقيع: أحمد أبو حمزة  
 التاريخ: ٢٠٠٢ / ١٦ / ٢٠٠٢

نوع الاقتطاع	الاقتطاعات	
	دينار	فلس
طوابع مستدق	٥٨٠	-
عملات ليرة + قران	١	٥٠٠
طوابع طرقات	١٩٠	٢٠٠
المجموع		





وزارة الاشغال العامة والاسكان

لائحة الوقائع

رقم ملف الوزارة : ٢٠٢٠ / ١٦

رقم الكتاب الوارد : ٥٦ / ٢٠٢٠ / ١٦ و

رقم تسجيل الوارد : ٥٤٧٢٢

تاريخه : ٢٠٢٠ / ١٢ / ٠٨

الموضوع : مطالبة ٤ / شركة حسان الكوز

مصدر الكتاب : المكتب الهندسي الاستشاري

التسلسل	التاريخ	الى	المشروعات والتوقيع
١	٢٠٢٠-١٢-٠٩	مدير تنفيذ الطرق	
	١٤ / ٥	٣ طاد	
		مدير تنفيذ الطرق	<p>أمر بكونه لجانته بكتابة رقم (٤) السيد</p> <p>المهندس السيد لسانه لسانه أعماله وأعماله وأعماله</p> <p>والتوقيع من السيد لسانه لسانه لسانه</p> <p>والتوقيع من السيد لسانه لسانه لسانه</p> <p>عمل في يوم ٢٠٢٠ / ١٢ / ٠٨</p> <p>٣ طاد</p> <p>١٤ / ٥</p>
	١٤ / ١٣	مدير الكورنيش	<p>أمر بكونه لجانته بكتابة رقم (٤) السيد</p> <p>المهندس السيد لسانه لسانه لسانه</p> <p>والتوقيع من السيد لسانه لسانه لسانه</p> <p>والتوقيع من السيد لسانه لسانه لسانه</p> <p>عمل في يوم ٢٠٢٠ / ١٢ / ٠٨</p> <p>٣ طاد</p> <p>١٤ / ٥</p>
	١٤ / ١٣	مدير الكورنيش	<p>أمر بكونه لجانته بكتابة رقم (٤) السيد</p> <p>المهندس السيد لسانه لسانه لسانه</p> <p>والتوقيع من السيد لسانه لسانه لسانه</p> <p>والتوقيع من السيد لسانه لسانه لسانه</p> <p>عمل في يوم ٢٠٢٠ / ١٢ / ٠٨</p> <p>٣ طاد</p> <p>١٤ / ٥</p>
	١٤ / ١٣	مدير الكورنيش	<p>أمر بكونه لجانته بكتابة رقم (٤) السيد</p> <p>المهندس السيد لسانه لسانه لسانه</p> <p>والتوقيع من السيد لسانه لسانه لسانه</p> <p>والتوقيع من السيد لسانه لسانه لسانه</p> <p>عمل في يوم ٢٠٢٠ / ١٢ / ٠٨</p> <p>٣ طاد</p> <p>١٤ / ٥</p>



الرقم : ٥٦/و/٢٠٢٠/١٦

التاريخ : ٢٠٢٠/١٢/٠٨

عطوفة أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان الأكرم

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : العطاء المركزي رقم (٢٠٢٠/١٦) الخاص

بتنفيذ ساحات التبادل التجاري في مركز حدود العمري (ساحة المناولة (Back to Back))

الجزء الأول

الموضوع : المطالبة المالية رقم (٤) - مطالبة المقاول

ارفق طيه نسخة عن كتاب مقاول المشروع موضوع البحث السادة / شركة حسان الكوز وشريكه للمقاولات رقم عمري / ٢٠٢٠/٢٤٦/ تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٠٧ والمتضمن المطالبة المالية رقم (٤) والخاصة بالمشروع المشار إليه أعلاه وبقيمة (277,607.885) مئتان وسبعة وسبعون ألفاً وستمئة وسبعة دنانير وفلساً ٨٨٥.

واود ان ابين لعطوفتكم بأنه قد تم مراجعة وتدقيق الاعمال الواردة في المطالبة المذكورة أعلاه، وتبين بأنها تنقسم الى قسمين ، حيث ان هناك اعمال تمت خلال فترة عملنا بالمشروع بقيمة (186,756.177) دينار وتم الاشراف من قبلنا عليها، واعمال اضافية تمت بعد انتهاء مهام عملنا بالمشروع بناء على التنسيق المباشر بين صاحب العمل والمقاول وبقيمة (90,851.708) دينار.

للتكرم عطوفتكم بالاطلاع والايعاز للسادة المعنيين باستكمال اجراءات التدقيق وصرف المطالبة بحسب الاصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

المكتب الهندسي الاستشاري العالمي

المهندس / جودت يغمور

- نسخة / السادة شركة حسان الكوز وشريكه للمقاولات

mer Co  
ng



شركة حسان الكوز وشريكه  
للمقاولات

الرقم : عمري / 246 / 2020

التاريخ : 07 / 12 / 2020

السادة المكتب الهندسي الاستشاري العالمي المحترمين ،،،  
المشروع : العطاء المركزي رقم 16 / 2020 الخاص بتنفيذ ساحة التبادل التجاري في مركز حدود العمري  
( ( ساحة المناولة ( Back To Back ) )  
الموضوع: المطالبة المالية رقم ( 4 )

تحية طيبة وبعد ،،

أرفق لكم طياً المطالبة المالية رقم ( 4 ) للأعمال المنجزة في العطاء موضوع البحث حتى تاريخه ، حيث  
بلغت صافي قيمة المطالبة (( 277607.885 دينار )) مائتان و سبعة و سبعون ألفاً و ستمائة و سبعة  
دنانير وقلـ885سأ لاغير .

راجين الموافقة بالتكريم والإيعاز لمن يلزم لتدقيقها وتصديقها وصرفها لنا حسب الأصول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة حسان الكوز وشريكه للمقاولات

- نسخة : وزارة الاثغال العامة و الاسكان
- نسخة ملف العطاء

شركة حسان الكوز وشريكه  
Hassan Al-Kouz and Partner

# اقرار استلام دفعة على الحساب

اقر أنا الموقع بمضاتي وخاتمي أدناه ( شركة حسن الكوز وشركاه ) المكون للموقعين  
امضاتنا وخاتمنا في أدناه ( شركة حسن الكوز ) باتنا قد

قبضنا من وزارة الاشغال العامة والإسكان مبلغ وقدره ( 186632728 ) دينار اردني لا غير

فقط ( جائزة وستة وثمانون ألفاً وستمائة وستة وثمانون ديناراً واربعة وثمانون )  
رقم ( 4 )

عن مشروع : ( تعمير بيهاية البتار لتيه في مركز جبرود لعمري )  
عطاء رقم : ( 1612020 )

٢٠٢٠ / ١٢ / ١٢

وعليه نوقع تحريرا

شركة حسن الكوز وشركاه  
Hassan Al-Kouz and Partners

اسم المقاول : شركة حسن الكوز وشركاه

اسم المفوض بالتوقيع

توقيع المفوض بالتوقيع :

الخاتم :

تم التوقيع بحضور :

الاسم :

الوظيفة :

التوقيع :

التاريخ :
